

玉川ポンプ場通信

2020年6月 Vol 8


発行:三井住友建設・外々・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・
日立建設・宇部興機・前村電気工事JV
発注者:宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。
工事の進捗状況は、玉川ポンプ場では地下11mまで掘削が進み、土留工と残土搬出作業を行っています。流入渠工事ではシールドマシンの組立作業を行っています。また、玉川ポンプ場から厚東川までの市道では片側交互通行により、放流渠築造工事に伴う支障物調査および撤去工事を施工しています。厚東川吐口工は4月から仮設栈橋工事を再開し、5月末に二重締切工事に着手しました。皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

◎工事の進捗状況

- ①玉川ポンプ場 令和2年9月まで、土留工と掘削作業および大型車両による残土搬出を行います。令和2年6月末でのシールドマシン発進に向け、マシン組立、準備工事を行います。
- ②吐口工 令和2年5月末から二重締切工事に着手し、9月に仮設締切り工事完了の予定です。
- ③放流渠工 市道の片側交互通行により、支障物調査および撤去工事をしています。その後、土留工事、本体工事へ着手する予定です。

第80工区 玉川ポンプ場建設工事 工事概要図

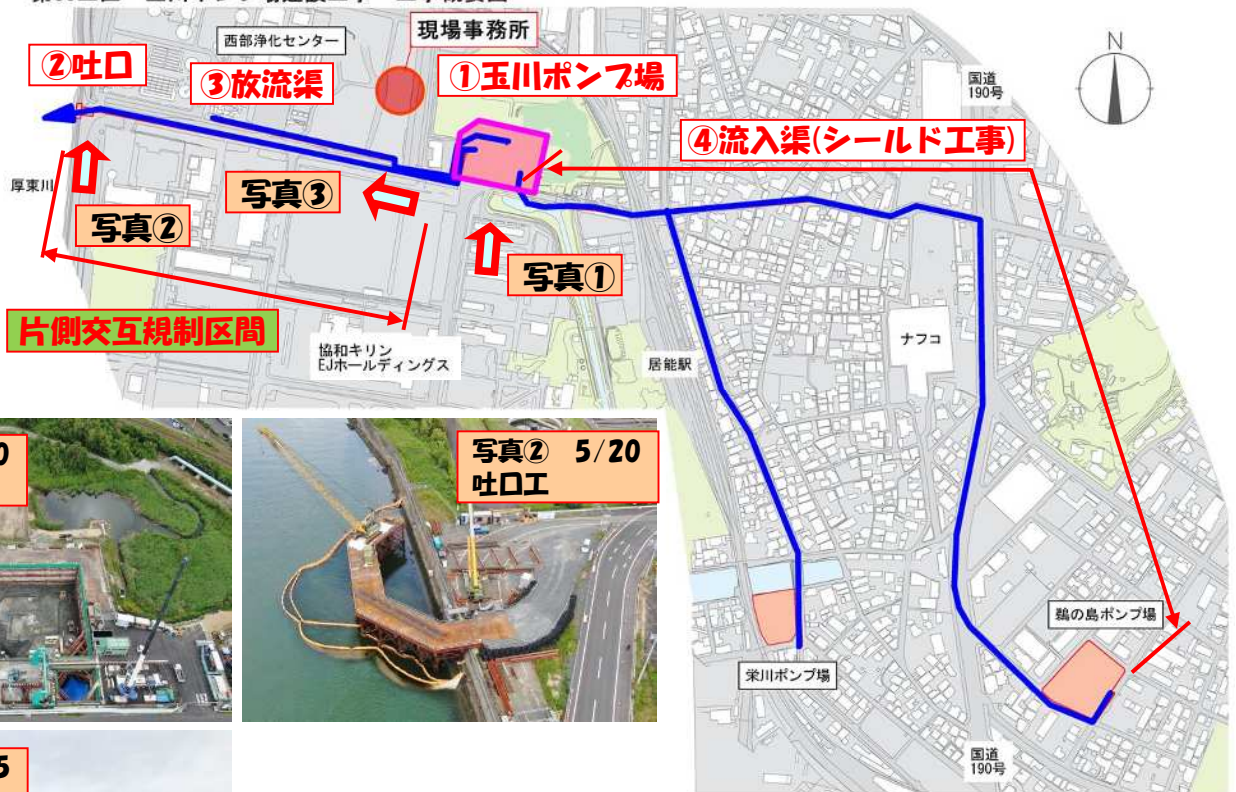

写真① 5/20
玉川ポンプ場



写真② 5/20
吐口工



写真③ 5/25
放流渠工

お問い合わせ先

三井住友建設JV 担当者：保崎、田中

TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018
