


# 玉川ポンプ場通信

発行：三井住友建設・外資・東芝インフラシステムズ・日本水工設計・日立建設・宇部興機・前村電気工事JV  
発注者：宇部市上下水道局 下水道企画室

地元関係者の皆様、『玉川ポンプ場建設工事』にご理解とご協力を頂き、ありがとうございます。  
流入渠工事（シールド工）は、5月24日に鶴の島ポンプ場東側の立坑に無事到達しました。  
シールド掘進を始めて約1年間、皆様に多くのご協力をいただき、到達することが出来ました。  
地域の皆様に心より感謝いたします、ありがとうございました。  
引き続き、鶴の島ポンプ場周辺の市道では、車両通行止めによるシールドマシン解体等の作業を行う予定です。  
また、令和3年9月から、栄川ポンプ場周辺で推進工事の準備工に着手する予定です。  
安全第一で作業しておりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

## ◎工事進捗状況の詳細

- ①玉川ポンプ場 ポンプ場工事では、地下2階部分の工事を順調に進めています。生コン車など大型車両が入りしますのでご注意ください。（写真①）
- ②吐口工 令和3年6月から、既設護岸の撤去工事に着手し、引き続き地盤改良工事を行う予定です。（写真②）
- ③放流渠工 放流渠本体の築造および地盤改良工事を施工ブロックに分けて施工しています。片側交互通行規制にて工事を行います。（写真③）
- ④流入渠工 シールドマシンが鶴の島ポンプ場東側の立坑に無事到達しました。鶴の島ポンプ場と国土交通省宇部国道維持出張所前の市道では、令和3年8月上旬までの予定で、シールドマシン解体作業など終日車両通行止めによる施工を行っています。（写真④）  
令和3年9月から、栄川ポンプ場周辺で推進工事の準備工に着手する予定です。付近をご通行の際はご注意くださいようお願いいたします。

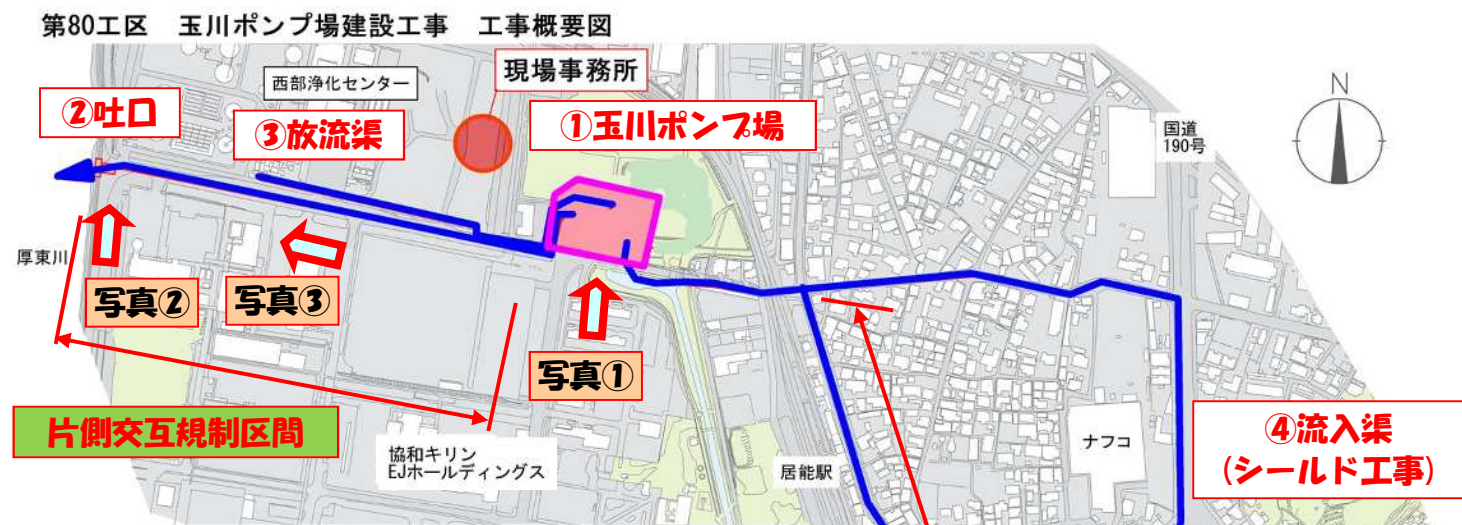

お問い合わせ先  
三井住友建設JV 担当者：保崎、田中  
TEL 0836-37-5017 FAX 0836-37-5018
